Annexe 1 : Planning du magazine VEL 2017

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	CONSULTATION	24j	14/09/16	17/10/16
2	Lancement de la consultation	0	14/09/16	14/09/16
3	Période de consultation	19j	14/09/16	10/10/16
4	Date limite de réception des offres	0	10/10/16	10/10/16
5	Analyse des offres	5j	11/10/16	17/10/16
6	Validation des prestataires retenus	0	17/10/16	17/10/16
7	RÉALISATION	71j	18/10/16	27/01/17
8	Réunion brief avec agence / rédacteur	3j	18/10/16	20/10/16
9	Travail agence / rédacteur	10,5j	21/10/16	07/11/16
10	Présentation des 1ères pages + chemin de fer	0	07/11/16	07/11/16
11	Validation mise en page + chemin de fer	2,5j	07/11/16	09/11/16
12	Retours LT à l'agence / rédacteur	1j	10/11/16	10/11/16
13	Mise en page (agence / rédacteur)	21j	14/11/16	12/12/16
14	Ajustements avant validation (LT)	2j	13/12/16	14/12/16
15	Validation version FR	2j	15/12/16	16/12/16
16	Finalisation version FR pour mise en impression	5j	19/12/16	23/12/16
17	Lancement des traductions	11j	19/12/16	03/01/17
18	Mise en page des versions étrangères	13j	04/01/17	20/01/17
19	Validation avant mise en impression (relecture DE et NL)	5j	23/01/17	27/01/17
20	IMPRESSION	11j	30/01/17	13/02/17
21	Mise en impression	11j	30/01/17	13/02/17
22	Livraison des magazines en FR, DE et NL	0	13/02/17	13/02/17
23				
24	OPTION VERSIONS NL ET FR PRIORITAIRES	25j	19/12/16	23/01/17
25	*Version NL*	25j	19/12/16	23/01/17
26	*Traduction NL*	6j	19/12/16	27/12/16
27	*Mise en page version NL*	10j	28/12/16	10/01/17
28	*Validation avant mise en impression NL*	5j	11/01/17	17/01/17
29	*Impression numérique NL (500ex)*	4j	18/01/17	23/01/17
30	*Livraison magazine en NL*	0	23/01/17	23/01/17
31	*Version FR*	11j	27/12/16	10/01/17
32	*Impression FR*	11j	27/12/16	10/01/17
33	*Livraison magazine en FR*	0	10/01/17	10/01/17
34				

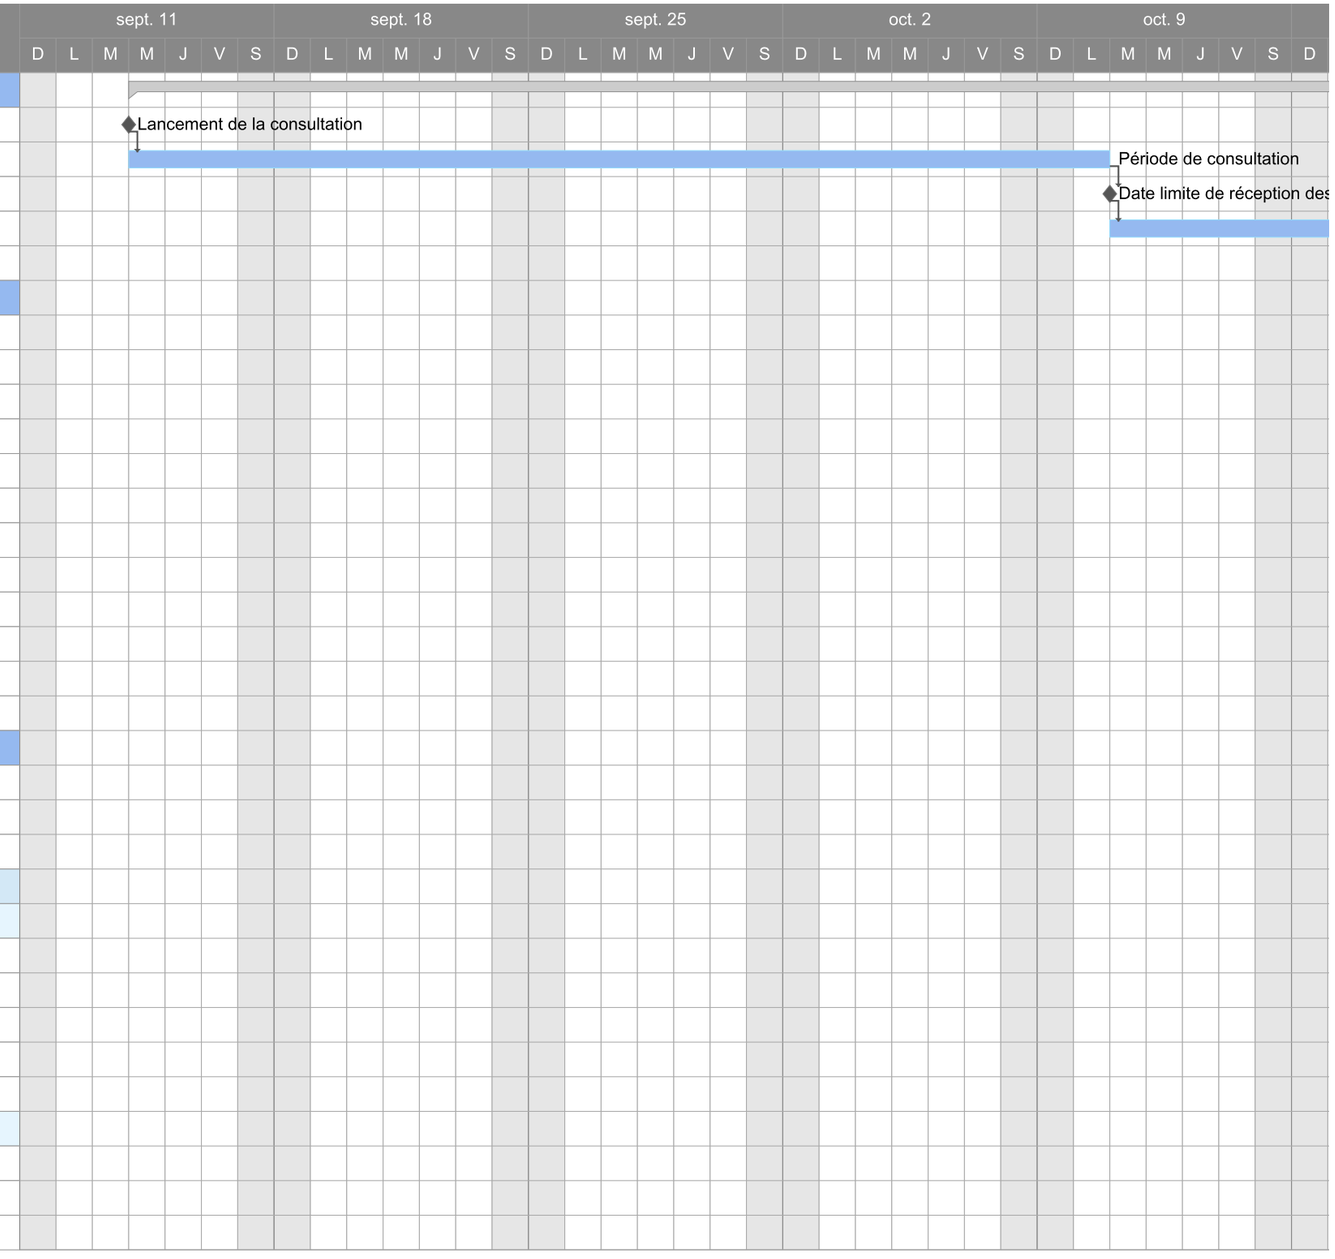

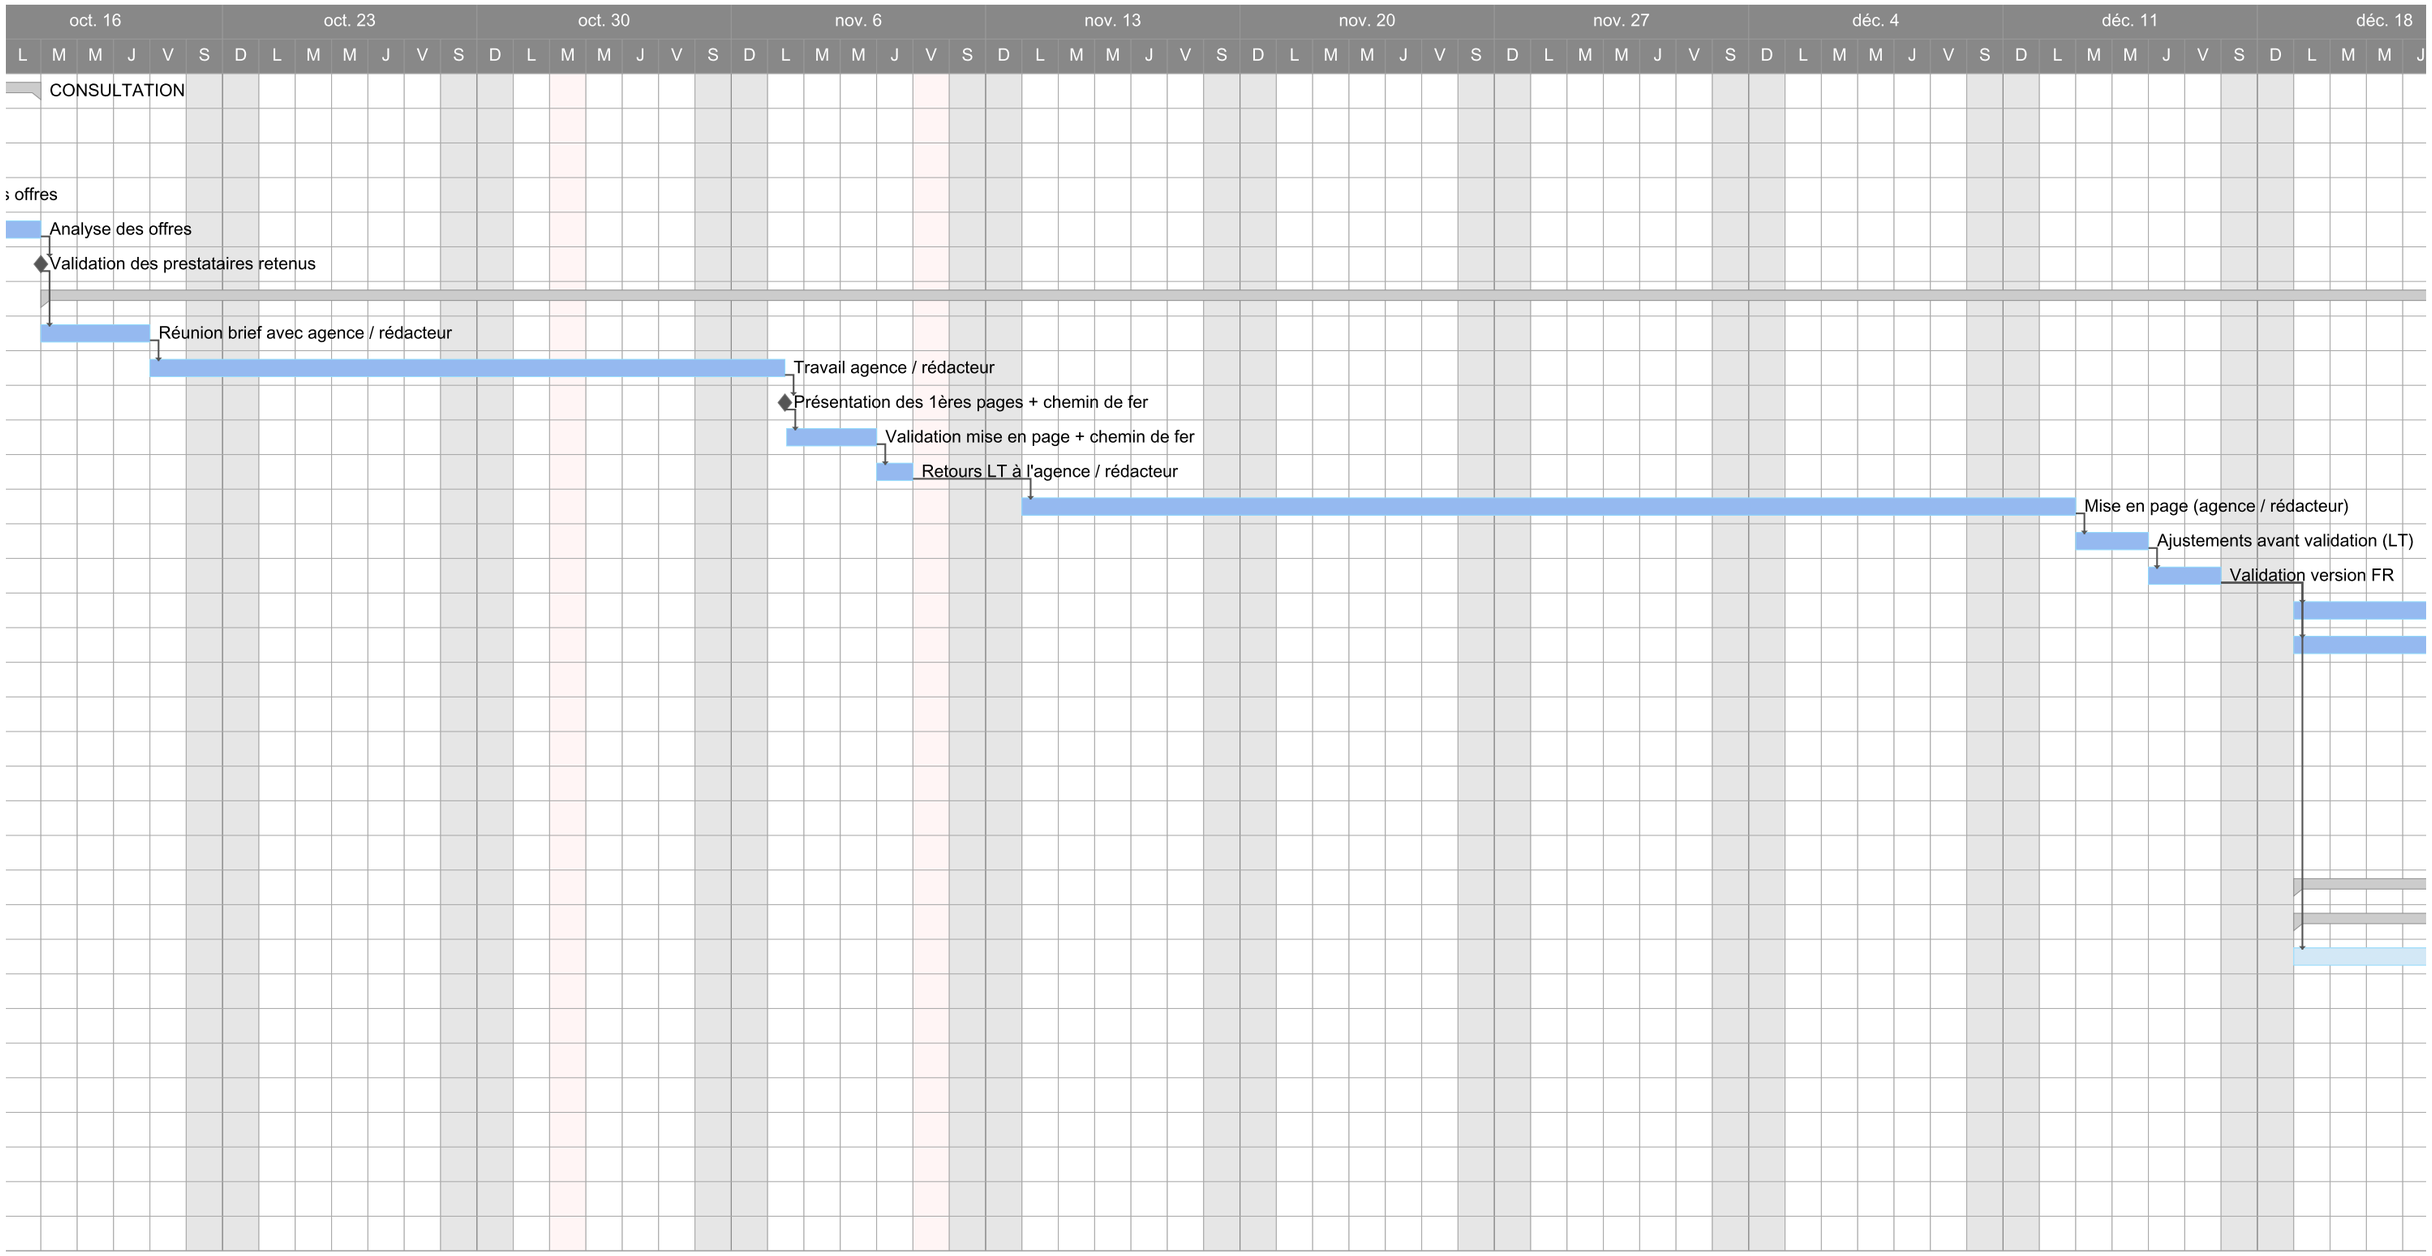
oct. 16
oct. 23
oct. 30
nov. 6
nov. 13
nov. 20
nov. 27
déc. 4
déc. 11
déc. 18
CONSULTATION
s offres
Analyse des offres
Validation des prestataires retenus
Réunion brief avec agence / rédacteur
Travail agence / rédacteur
Présentation des 1ères pages + chemin de fer
Validation mise en page + chemin de fer
Retours LT à l'agence / rédacteur
Mise en page (agence / rédacteur)
Ajustements avant validation (LT)
Validation version FR

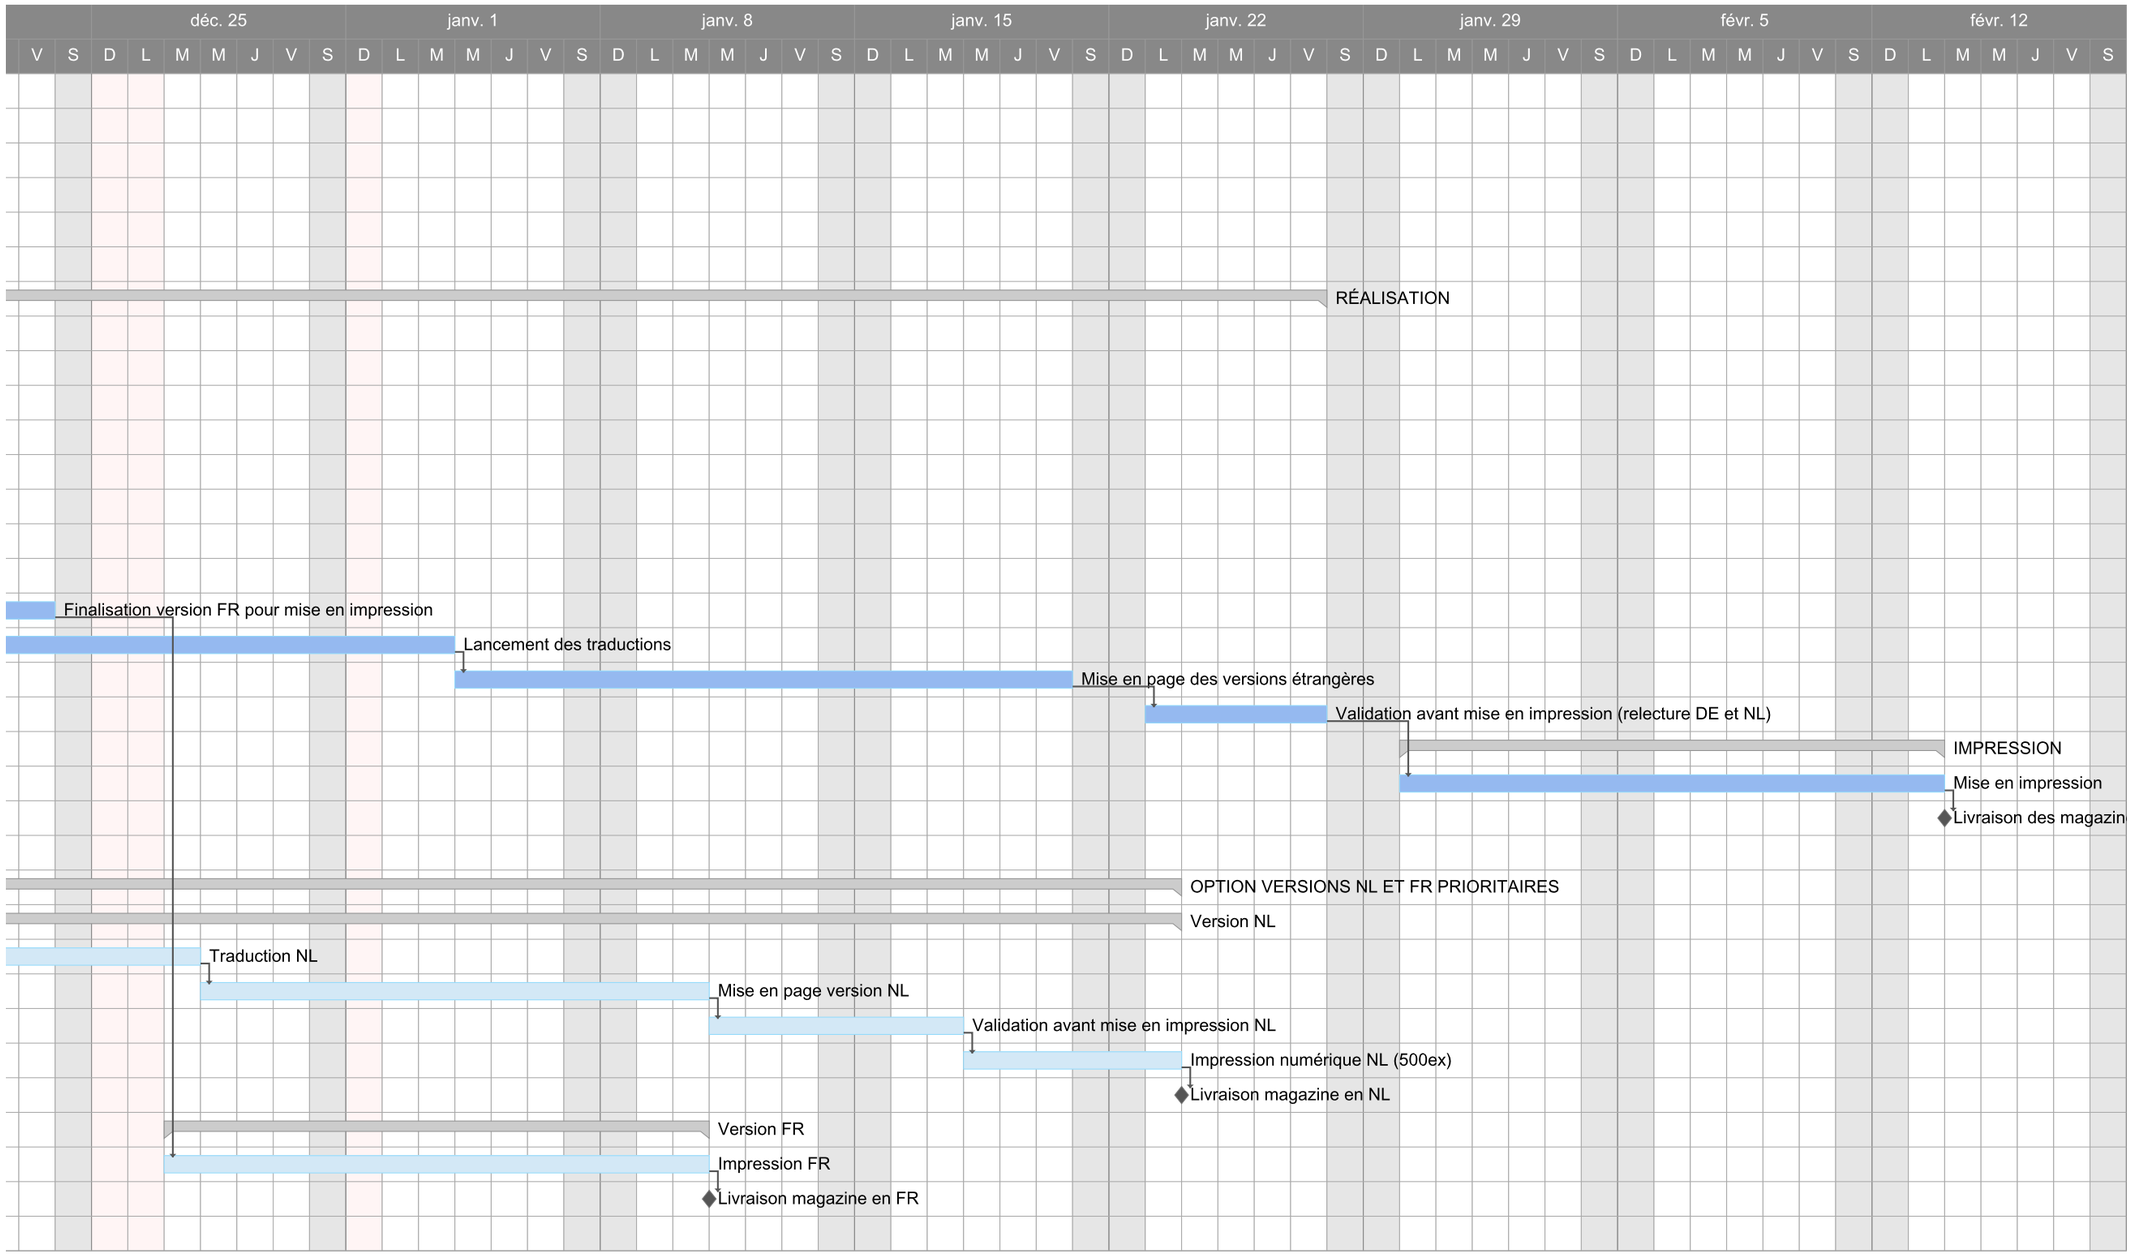
déc. 25
janv. 1
janv. 8
janv. 15
janv. 22
janv. 29
févr. 5
févr. 12
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
RÉALISATION
Finalisation version FR pour mise en impression
Lancement des traductions
Mise en page des versions étrangères
Validation avant mise en impression (relecture DE et NL)
IMPRESSION
Mise en impression
Livraison des magazin
OPTION VERSIONS NL ET FR PRIORITAIRES
Version NL
Traduction NL
Mise en page version NL
Validation avant mise en impression NL
Impression numérique NL (500ex)
Livraison magazine en NL
Version FR
Impression FR
Livraison magazine en FR
